


新庁舎建設現場からのお知らせ

日頃から庁舎建設工事にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。工事の内容をよりわかりやすくお伝えするため、現在計画している工事やこれから出入りする重機などの情報を含め、今後予定している作業内容を定期的にお伝えします。今後とも工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。

【8月の予定作業内容】

今月の主な作業は土を掘る（掘削）工事と鉄筋コンクリートの基礎をつくる工事です。下図のように現場を3つのエリアにわけて工事を進めます。

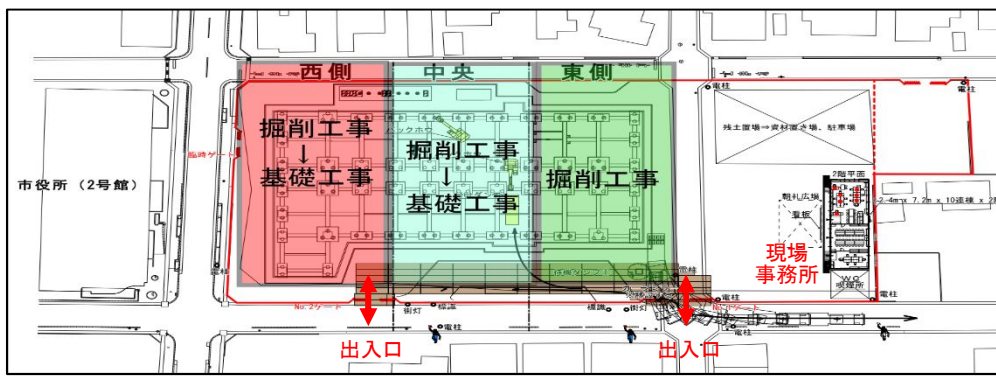

- ◎西側（赤）：上旬に掘削工事、中旬～下旬は基礎工事
- ◎中央（青）：上旬～中旬に掘削工事、下旬に基礎工事
- ◎東側（緑）：下旬に掘削工事

【今後、出入りする新たな重機・車両】

- ①資材を持ち上げるための大型クレーンが1台、そのほかのクレーン数台が入ります。
 - ②掘った土を搬出するトラック6台前後が1日あたり10往復程度出入りします。
 - ③コンクリート工事のため、10t生コン車が5台前後1日あたり3往復程度出入りします。また、コンクリートを流し込む大型ポンプ車が1台出入りします。
 - ④資材納入車両（4t～10t車）が毎日数台出入りします。
- ※引き続き安全運転に心がけ、入口には誘導員を配置して進めます。

【工事日時（予定）】

- ◎平日と第1・3土曜日及び8/11の祝日は通常稼働となります。作業時間8:00～18:00
悪天候や工事の進捗により変更する場合があります。
- ◎お盆休みは8/13（土）～16（火）を予定しています。

【お問い合わせ先】

- ご不明な点はお気軽にご連絡ください。
- ◎現場：フジタ・渡辺・福永特定工事共同企業体 0995-67-6151
 - ◎市役所：庁舎建設課 0995-66-3075
