

市管理公共土木施設の被害状況および対応状況

- 令和7年8月8日未明から始良市に線状降水帯が発生し、未曾有の大雨に見舞われ、道路の法面崩壊、河川の浸水被害や河川決壊、がけ崩れ等の土砂災害など多数の公共土木施設災害が発生しました。
- 始良市が管理する公共土木施設の被災状況は、約37箇所のうち34箇所災害査定を受け、被害総額は約8億円(11月21日災害査定終了時)にのぼりました。

工種	国災害復旧事業		対応状況(箇所数)				備考
	箇所数	金額(百万円)	災害調査	応急工事	災害査定	復旧工事	
道路	14	362	15	1	14	0	国災害復旧事業の箇所数や金額は、災害査定前の網掛通線を除いたもの
河川	20	433	20	4	20	0	
橋梁	0	0	2	1	0	0	国災害復旧事業の箇所数や金額は、災害査定前の錦江橋・中田橋を除いたもの
計	34	795	37	6	34	0	

※災害査定後に正確な金額が決定します。

お問合せ先

始良市土木課 TEL:0995-66-3404(直通)

※今回の資料は、始良市ホームページでご確認できます。
※詳しい通行止め箇所は、災害マップでご確認できます。



市HP



災害マップ

これまでの取り組みと災害復旧の流れ

災害調査

完了



道路啓開・応急工事

完了

道路啓開や大規模災害支援協定に基づく建設業関係団体による応急工事を実施



災害復旧

災害査定

国庫補助事業による復旧工事の費用を決定するため、国が被害の程度や復旧工法・費用が適切か現地調査を実施(令和7年11月4日～令和8年1月28日)

調査設計

査定結果を踏まえた工法見直しや、構造物がある箇所について詳細に検討。

用地取得

道路・河川等において用地を取得。

復旧工事

緊急性の高い箇所、調査設計や用地取得を伴わない箇所から順次、工事着手。


主な災害箇所(始良市)



始良市の範囲

通行規制状況

- ✕ 通行止め 12箇所
- ✕ 護岸決壊 3箇所

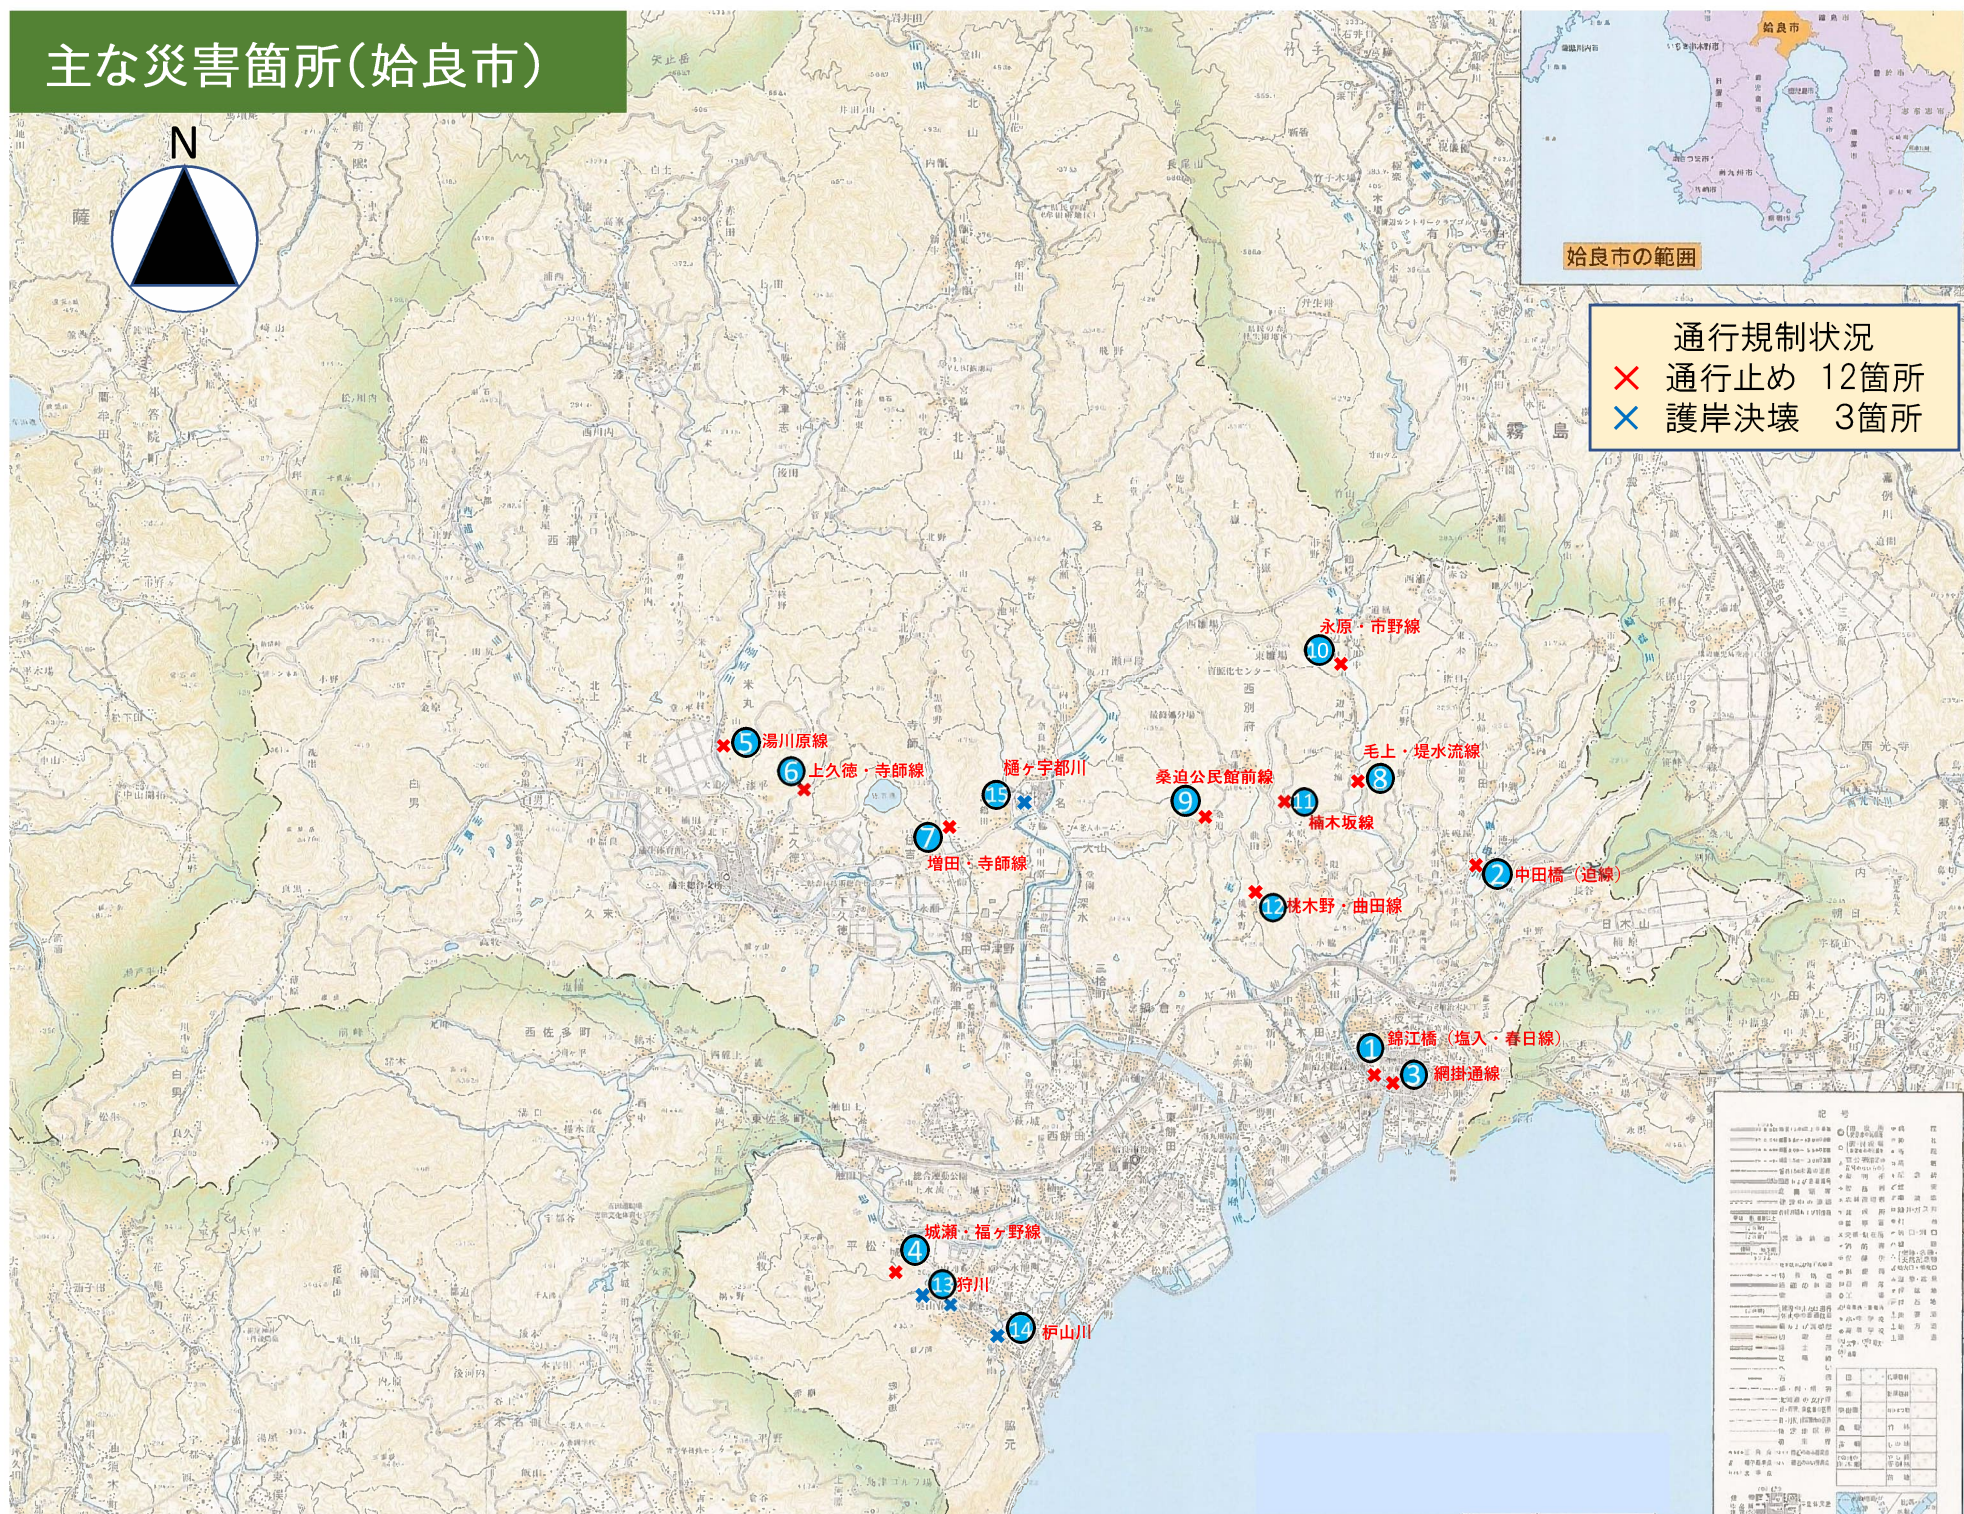

記号	説明
①	通行止め
②	通行止め
③	通行止め
④	通行止め
⑤	通行止め
⑥	通行止め
⑦	通行止め
⑧	通行止め
⑨	通行止め
⑩	通行止め
⑪	通行止め
⑫	通行止め
⑬	護岸決壊
⑭	護岸決壊
⑮	護岸決壊

令和7年8月豪雨災害 対応状況(始良市)

① 錦江橋(塩入・春日線) 加治木町本町

○被災状況
橋梁沈下



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R8年1月予定
復旧延長：L=60m(査定前・原形)
復旧予定：未定

② 中田橋(迫線) 加治木町小山田

○被災状況
橋梁流失

被災状況



対応状況



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R8年1月予定
復旧延長：L=28.7m
(査定前・原形)
復旧予定：未定


③ 網掛通線 加治木町本町

○被災状況
道路決壊

被災状況



対応状況



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R8年1月予定
復旧延長：L=44.5m(査定前)
復旧予定：未定

④ 城瀬・福ヶ野線 平松

○被災状況
路肩決壊



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=24.5m
復旧予定：R8年3月着工予定

⑤ 湯川原線 蒲生町米丸

○被災状況
道路流出

被災状況



対応状況



○対応状況
通行規制：通行止め
復旧延長：L=70.5m
災害査定：R7年11月完了
復旧予定：R8年3月着工予定

⑥ 上久徳・寺師線 蒲生町上久徳

○被災状況
路肩決壊



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=31m
復旧予定：R8年3月着工予定

⑦ 増田・寺師線 寺師

○被災状況
路肩決壊



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=21m
復旧予定：R8年3月 着工予定

⑧ 毛上・堤水流線 加治木町西別府

○被災状況
路肩決壊



○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=51m
復旧予定：R8年3月着工予定

令和7年8月豪雨災害 復旧状況(始良市)

⑨ 桑迫公民館前線 加治木町西別府

○被災状況
道路流出

○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=33m
復旧予定：R8年3月着工予定



⑩ 永原・市野線 加治木町辺川

○被災状況
道路流出

○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=92.3m
復旧予定：R8年3月着工予定



⑪ 楠木坂線 加治木町西別府

○被災状況
道路流出

○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=19.6m
復旧予定：R8年3月着工予定



⑫ 桃木野・曲田線 加治木町西別府

○被災状況
路肩決壊

○対応状況
通行規制：通行止め
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=8m
復旧予定：R8年3月着工予定



⑬ 狩川 平松

○被災状況
護岸決壊

○対応状況
通行規制：—
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=23m
復旧予定：R8年2月着工予定

被災状況



対応状況



⑭ 栢山川 平松

○被災状況
護岸決壊

○対応状況
通行規制：—
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=27.5m
復旧予定：R8年2月着工予定



⑮ 樋ヶ宇都川 下名

○被災状況
護岸決壊

○対応状況
通行規制：—
災害査定：R7年11月完了
復旧延長：L=10.5m
復旧予定：R8年2月着工予定

被災状況



対応状況

