

市管理公共土木施設の被害状況および対応状況

- 令和7年8月8日未明から始良市に線状降水帯が発生し、未曾有の大雨に見舞われ、道路の法面崩壊、河川の浸水被害や河川決壊、がけ崩れ等の土砂災害など多数の公共土木施設災害が発生しました。
- 始良市が管理する公共土木施設の被災状況は、37箇所、被害総額は約41億円にのぼる大災害となりました。

工種	国災害復旧事業		対応状況(箇所数)					備考
	箇所数	金額 (百万円)	災害調査	応急工事	災害査定	復旧工事中	復旧完了	
道路	15	535	15	1	15	12	3	
河川	20	433	20	4	20	17	3	
橋梁	2	3,114	2	1	2	1	0	
計	37	4,082	37	6	37	30	6	

お問合せ先

始良市土木課 TEL:0995-66-3404(直通)

※今回の資料は、始良市ホームページでご確認できます。
※詳しい通行止め箇所は、災救マップでご確認できます。



市HP



災救マップ

これまでの取り組みと災害復旧の流れ

災害調査

完了



道路啓開・応急工事

完了

道路啓開や大規模災害支援協定に基づく建設業関係団体による応急工事を実施



災害復旧

完了

国庫補助事業による復旧工事の費用を決定するため、国が被害の程度や復旧工法・費用が適切か現地調査を実施(令和7年11月4日～令和8年1月30日)

調査設計

査定結果を踏まえた工法見直しや、構造物がある箇所について詳細に検討。

用地取得

道路・河川等において用地を取得。

復旧工事

緊急性の高い箇所、調査設計や用地取得を伴わない箇所から順次、工事着手。


主な災害箇所(始良市)



始良市の範囲

【凡例】

- ✕ 道路 12箇所
- ✕ 河川 3箇所

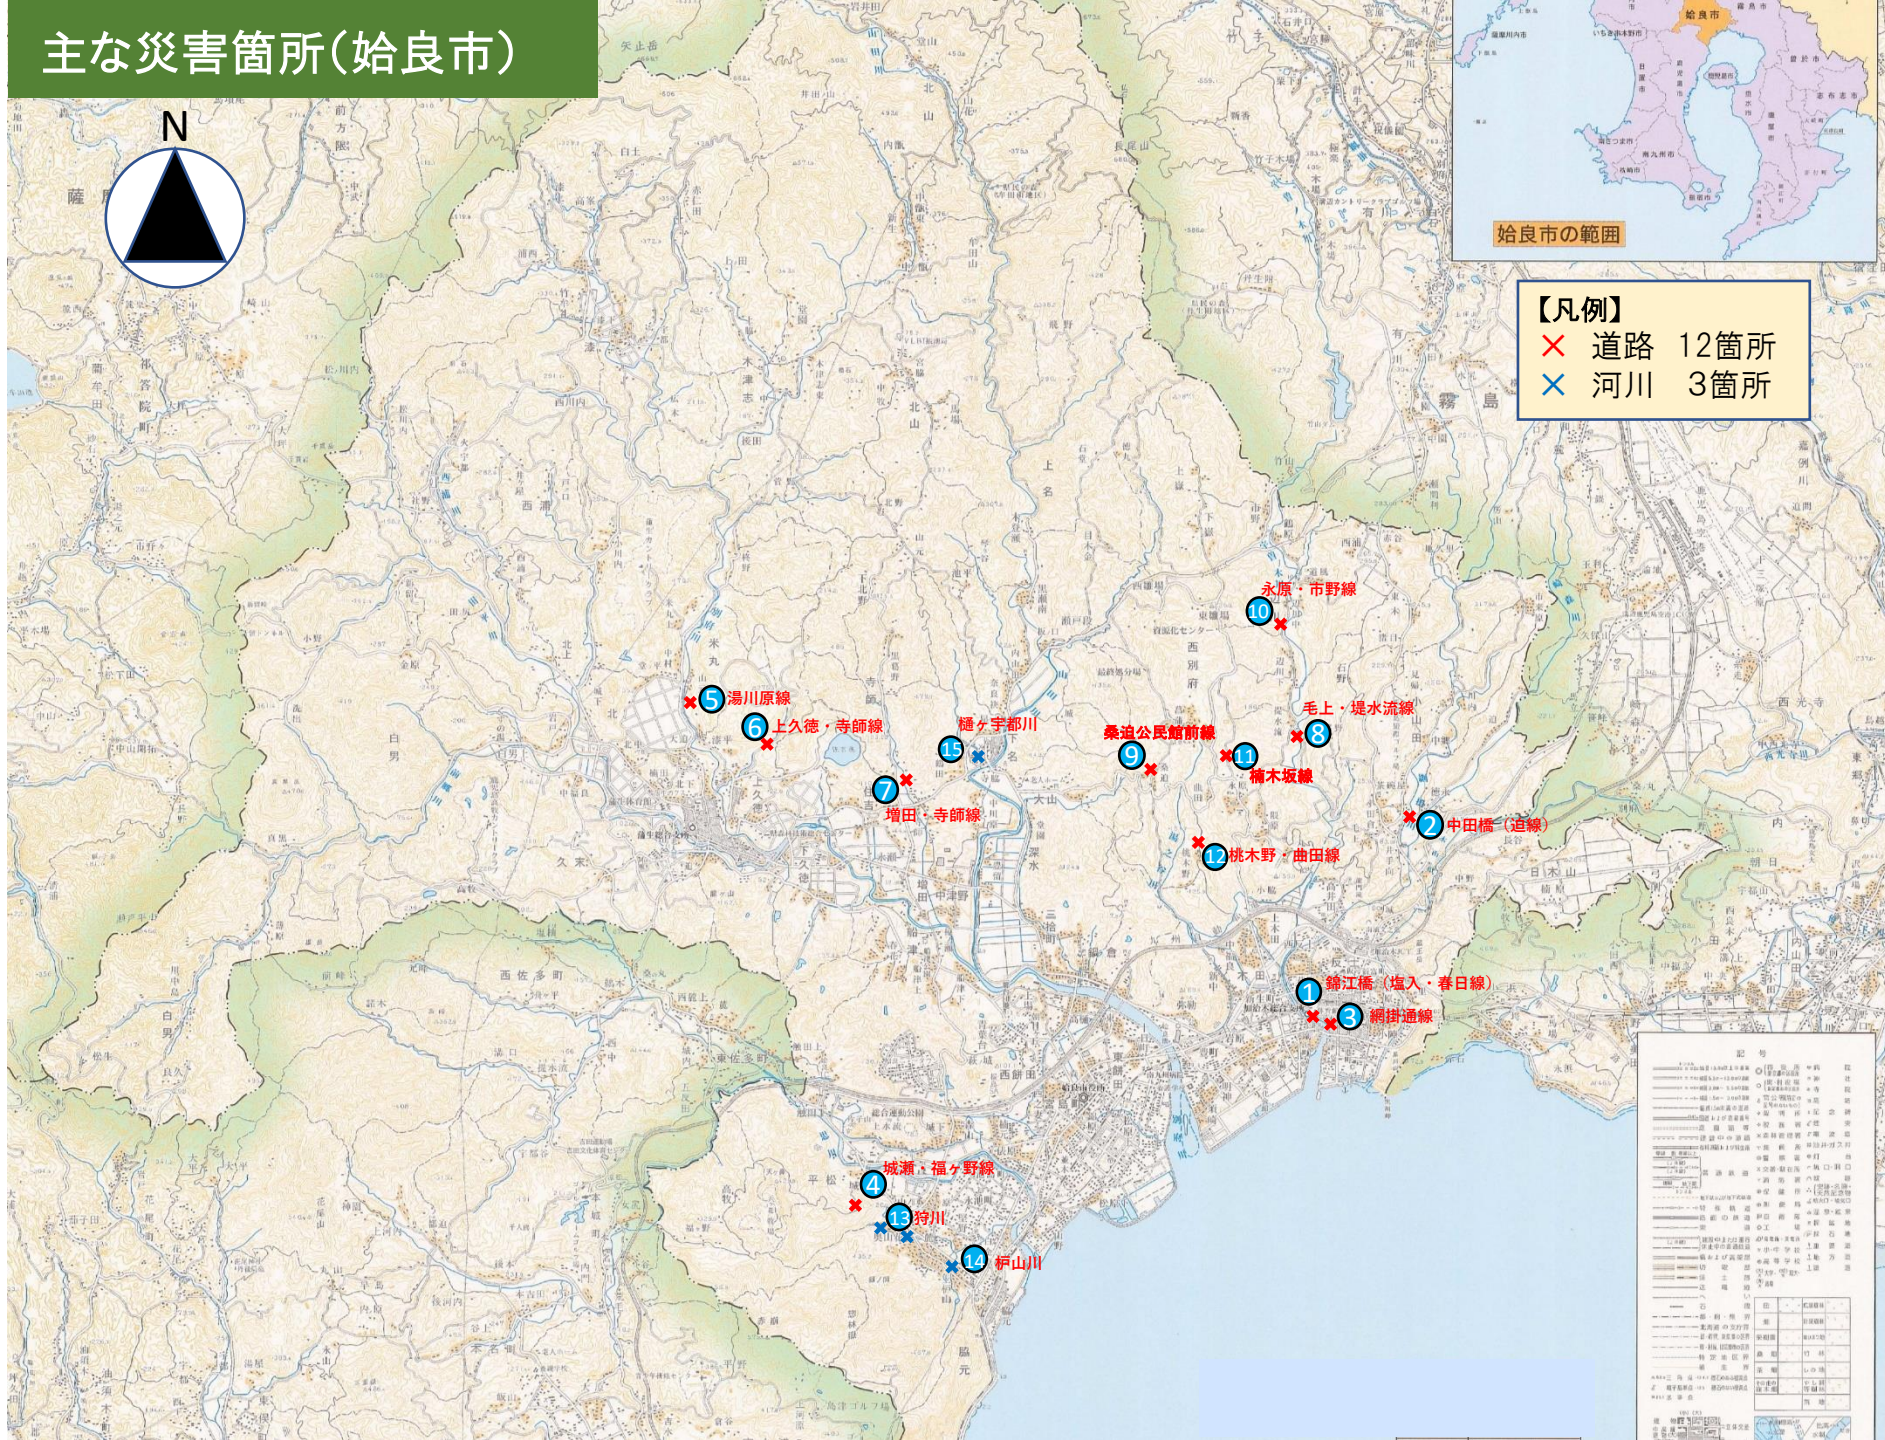

記号		説明	
○	市庁舎	○	市立病院
△	市立図書館	△	市立公民館
◇	市立体育館	◇	市立児童館
□	市立老人福祉センター	□	市立障害者福祉センター
●	市立児童遊園地	●	市立公園
■	市立緑地	■	市立墓地
○	市立公民館	○	市立図書館
△	市立体育館	△	市立児童館
◇	市立老人福祉センター	◇	市立障害者福祉センター
●	市立児童遊園地	●	市立公園
■	市立緑地	■	市立墓地
○	市立公民館	○	市立図書館
△	市立体育館	△	市立児童館
◇	市立老人福祉センター	◇	市立障害者福祉センター
●	市立児童遊園地	●	市立公園
■	市立緑地	■	市立墓地

令和7年8月豪雨災害 対応状況(始良市)

① 錦江橋(塩入・春日線) 加治木町本町

○被災状況

橋梁沈下

※迂回ルート(歩行者・自転車)は
市ホームページで確認できます

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R8年1月完了

復旧延長：L=65m

工事着工：R8年9月予定(複数年)

工事完了：R13年5月予定

被災状況



② 中田橋(迫線) 加治木町小山田

○被災状況

橋梁流失

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R8年1月完了

復旧延長：L=28.7m

工事着工：R8年4月

工事完了：R10年3月予定

被災状況



対応状況



③ 網掛通線 加治木町本町

○被災状況

道路決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R8年1月完了

復旧延長：L=44.5m

工事着工：R8年6月

工事完了：R9年2月予定

被災状況



対応状況



④ 城瀬・福ヶ野線 平松

○被災状況

路肩決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=24.5m

工事着工：R8年4月

工事完了：R8年11月予定

被災状況



⑤ 湯川原線 蒲生町米丸

○被災状況

道路流出

○対応状況

通行規制：通行止め

復旧延長：L=70.5m

災害査定：R7年11月完了

工事着工：R8年4月

工事完了：R8年12月予定

被災状況



対応状況



⑥ 上久徳・寺師線 蒲生町上久徳

○被災状況

路肩決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=31m

工事着工：R8年3月

工事完了：R8年9月予定

被災状況



対応状況



⑦ 増田・寺師線 寺師

○被災状況

路肩決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=21m

工事着工：R8年2月

工事完了：R8年6月

被災状況



対応状況



⑧ 毛上・提水流線 加治木町西別府

○被災状況

路肩決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=51m

工事着工：R8年1月

工事完了：R8年6月

被災状況



対応状況



令和7年8月豪雨災害 対応状況(始良市)

⑨ 桑迫公民館前線 加治木町西別府

○被災状況

道路流出

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=33m

工事着工：R8年7月

工事完了：R9年3月予定

被災状況



対応状況



⑩ 永原・市野線 加治木町辺川

○被災状況

道路流出

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=92.3m

工事着工：R8年9月予定

工事完了：R9年3月予定

被災状況



⑪ 楠木坂線 加治木町西別府

○被災状況

道路流出

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=19.6m

工事着工：R8年7月

工事完了：R9年2月予定

被災状況



対応状況



⑫ 桃木野・曲田線 加治木町西別府

○被災状況

路肩決壊

○対応状況

通行規制：通行止め

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=8m

工事着工：R8年7月

工事完了：R8年11月予定

被災状況



対応状況



⑬ 狩川 平松

○被災状況

護岸決壊

○対応状況

通行規制：—

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=23m

工事着工：R8年2月

工事完了：R8年9月予定

被災状況



対応状況



⑭ 栢山川 平松

○被災状況

護岸決壊

○対応状況

通行規制：—

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=27.5m

工事着工：R8年2月

工事完了：R8年7月

被災状況



対応状況



⑮ 樋ヶ宇都川 下名

○被災状況

護岸決壊

○対応状況

通行規制：—

災害査定：R7年11月完了

復旧延長：L=10.5m

工事着工：R8年3月

工事完了：R8年7月

被災状況



対応状況



令和7年8月豪雨災害 今後の災害復旧について

【令和7年度】8月の災害発生後、災害調査、道路啓開・応急復旧、災害査定を終え、調査設計や用地取得を伴わない箇所を中心に発注・契約。
【令和8年度】道路の流出や発生箇所、河川拡幅、砂防堰堤工事等については、調査設計後、地域の方々のご協力をいただきながら用地を取得し、早期に着工する予定。
【情報発信】 令和7年12月下旬より、始良市ホームページで「災害復旧だより」を公開中。

種別	復旧箇所の概要			対応状況		R 8 年度				R 9 年度			
				R 7 年 8 月時点	R 8 年 7 月時点	6	9	12	3	6	9	12	3
災害復旧	道路	1 5 箇所	道路流出 法面崩壊	・道路復旧 ・法面復旧 等	通行止め 1 5 箇所	通行止め 1 2 箇所 用地取得 完了 工事契約 1 5 箇所 交通開放 3 箇所	復旧工事						
	河川	2 0 箇所	護岸損壊など	・護岸復旧 等		用地取得 完了 工事契約 2 0 箇所 工事完了 3 箇所	復旧工事						
		錦江橋	加治木町本町地内	・橋梁架変替等	事業採択 R 8 年 4 月 地元説明 R 8 年 3 月	測量設計 R 8 年 9 月まで 工事契約 R 8 年 9 月予定	調査設計	復旧工事 R 1 3 年 5 月予定					
災害関連	橋梁	中田橋 (県による 受託工事)	加治木町小山田地内	・橋梁架変替等	事業採択 R 8 年 1 月 測量設計 R 8 年 5 月完了 地元説明 R 8 年 3 月 (県)	用地取得 R 8 年 6 月以降 工事契約 R 8 年 5 月	用地取得	復旧工事					
		中郷橋 (県事業)	加治木町小山田地内	・橋梁架変替等	事業採択 R 8 年 4 月 測量設計 R 8 年 3 月完了 地元説明 R 8 年 3 月実施	※調整中	調整中						
